



CRKVA VAVEDENJA BOGORODICE

Belo Polje
Opština Peć

Referenca: RIC 23

Preduzimač: Ukras (Zvečan)

Plan rada: Oktobar-Decembar 2006

Budžet: 30,485 Evra

PREGLED INTERVENCIJA:



Priprema gradilišta: Čišćenje i rušenje uništenih elemenata. Zaštita fresaka unutar crkve

Spoljašnjost:

- Drenažni sistem oko crkve
- Popravljanje ili zamena maltera spolja
- Staza oko crkve
- Nova drvena stolarija
- Farbarski radovi

Unutrašnjost:

- Opravka kamenog poda
- Popravljanje oštećenog maltera na zidovima i farbanje
- Električne instalacije

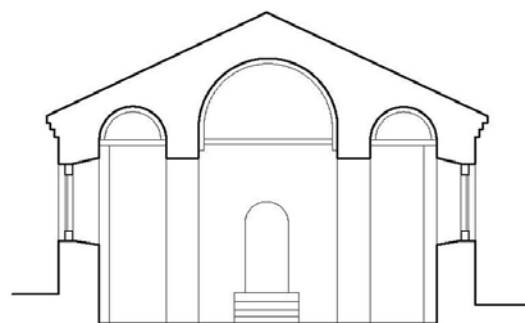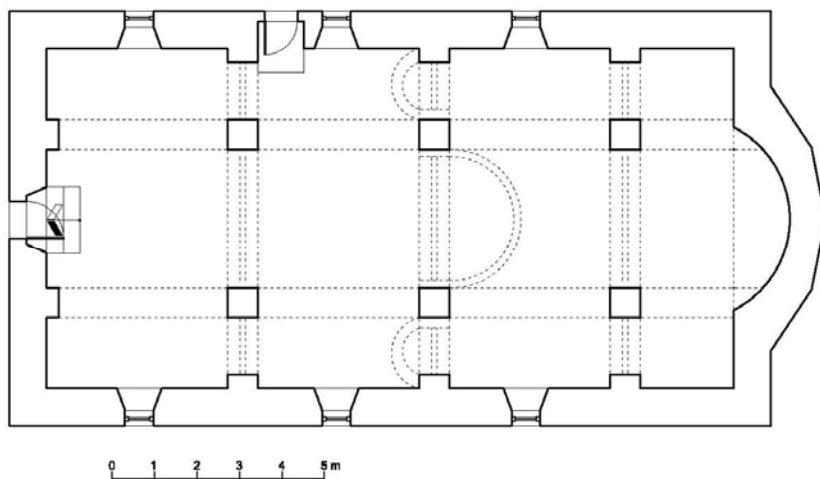

CRKVA VAVEDENJA BOGORODICE, BELO POLJE



Crkva posle marta 2004




Sadašnji izgled



U unutrašnjosti veći deo oštećenog maltera je zamenjen sa krečnim malterom naročito na nižim zidnim površinama crkve. Nove drvene hrastove grede su postavljene poprečno u odnosu na svodove da bi se zamenile utege. Nove grede su pojačane sa čeličnom šipkama, kameni podovi su popravljani zamenjivanjem oštećenih ploča i popunjavanjem fuga.

Da bi se postavila električna instalacija za osvetljenje postavljane kablove je pažljivo uradjeno da bi se izbegli delovi zidova gde postoje freske.

Tokom intervencije se obraćala posebna pažnja za očuvanje fresaka, koje zahtevaju dalju procenu kao i detaljni program konzervacije.

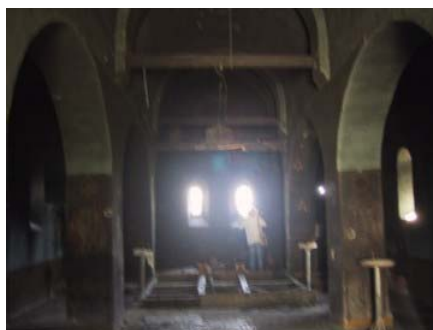

Početno stanje unutrašnjosti crkve



Unutrašnjost crkve nakon radova restauracije



Nakon zamene krova koji je uradjen 2005, intervencije uradjene tokom 2006 su kompletirale spoljašnje opravke crkve.

Radovi restauracije fasade su kompletirani, pukotine popunjene malterom, i svi zidovi su okrečeni i ofarbani.

Drvena vrata i prozori su zamenjeni sa novim hrastovim vratima i prozorima.

Problem sa vlagom koja je postojao u temelju zidova je rešen instaliranjem novog obimnog drenažnog sistema.

Oko crkve je takodje napravljena nova staza.
